
Parada de planta · Chancador primario


Reporte de planificación · Línea base · Inicio 16-11-2026 07:00 · Calendario continuo 24/7, turnos de 12 h

Duración programada	Margen sobre ventana	Costo mano de obra y grúa	Horas hombre	Actividades críticas
61 h	**11 h**	**$ 10,1 M**	**341 HH**	**16 de 24**
de 72 h de ventana	15% de colchón	$10.135.000 CLP, sin repuestos	sin contar grúa	67% en ruta crítica

Curva S de avance planificado (%)

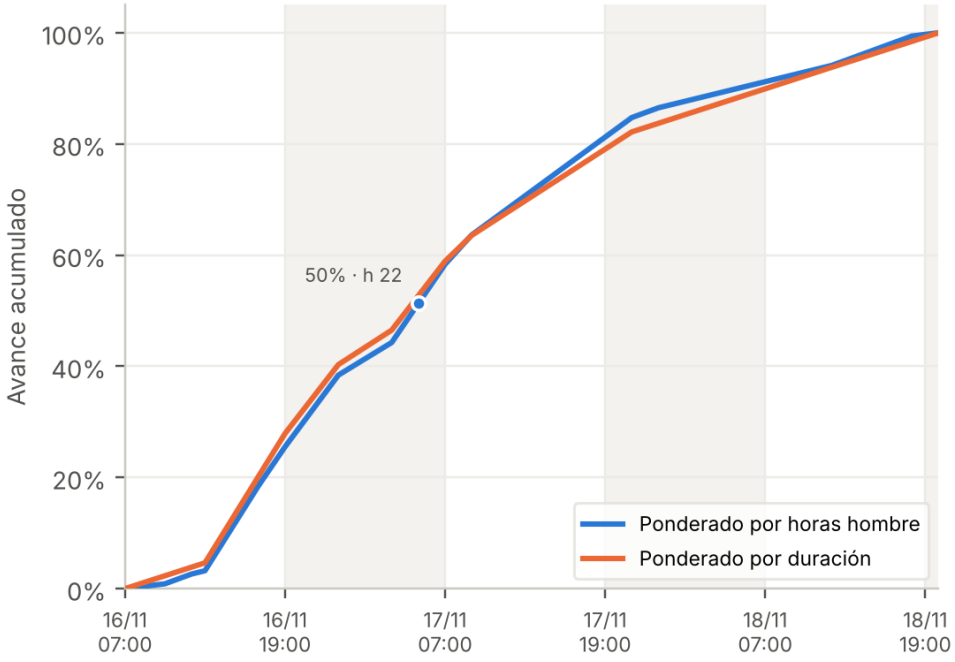


Curva S de costo acumulado (CLP)

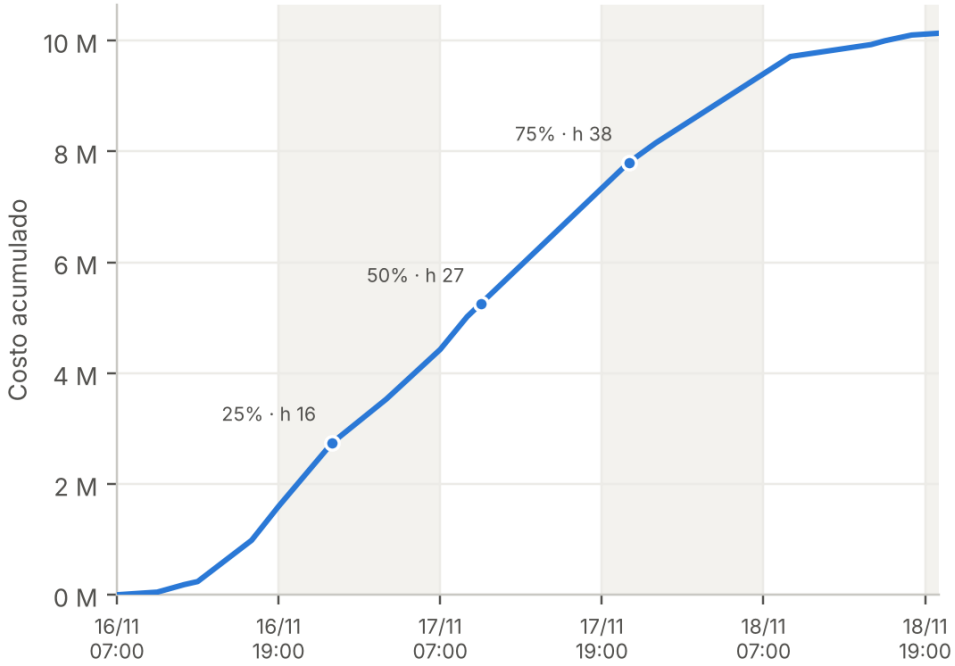

Lectura: ambas curvas llegan al 50% en la hora 22 y casi coinciden (diferencia máxima 2.8 puntos, hora 40), porque casi todas las tareas llevan 2 a 3 personas.

Programa y ruta crítica


Diagrama de Gantt por fase · Holgura total en línea punteada · Fondo gris = turno noche

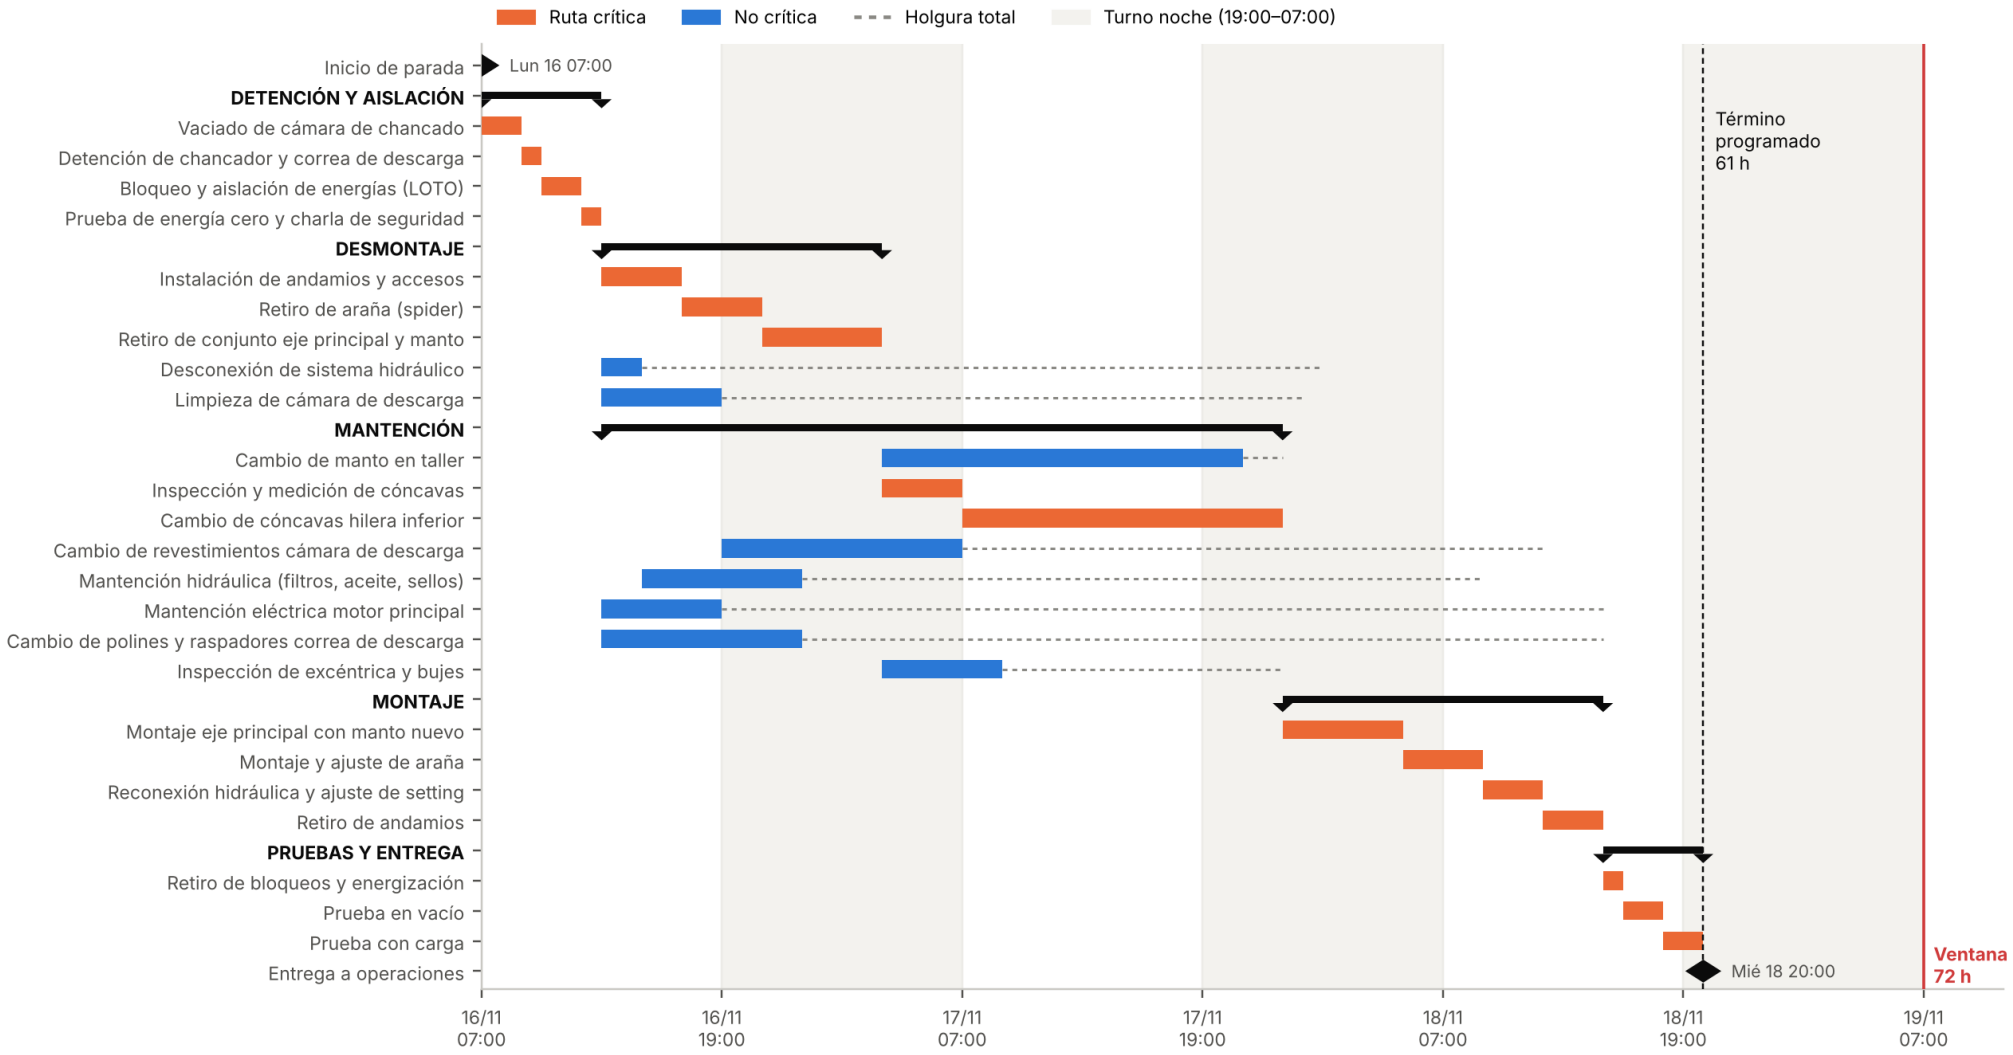


Recursos y costos

Dotación en terreno hora a hora y distribución del costo de la parada


Histograma de dotación por hora

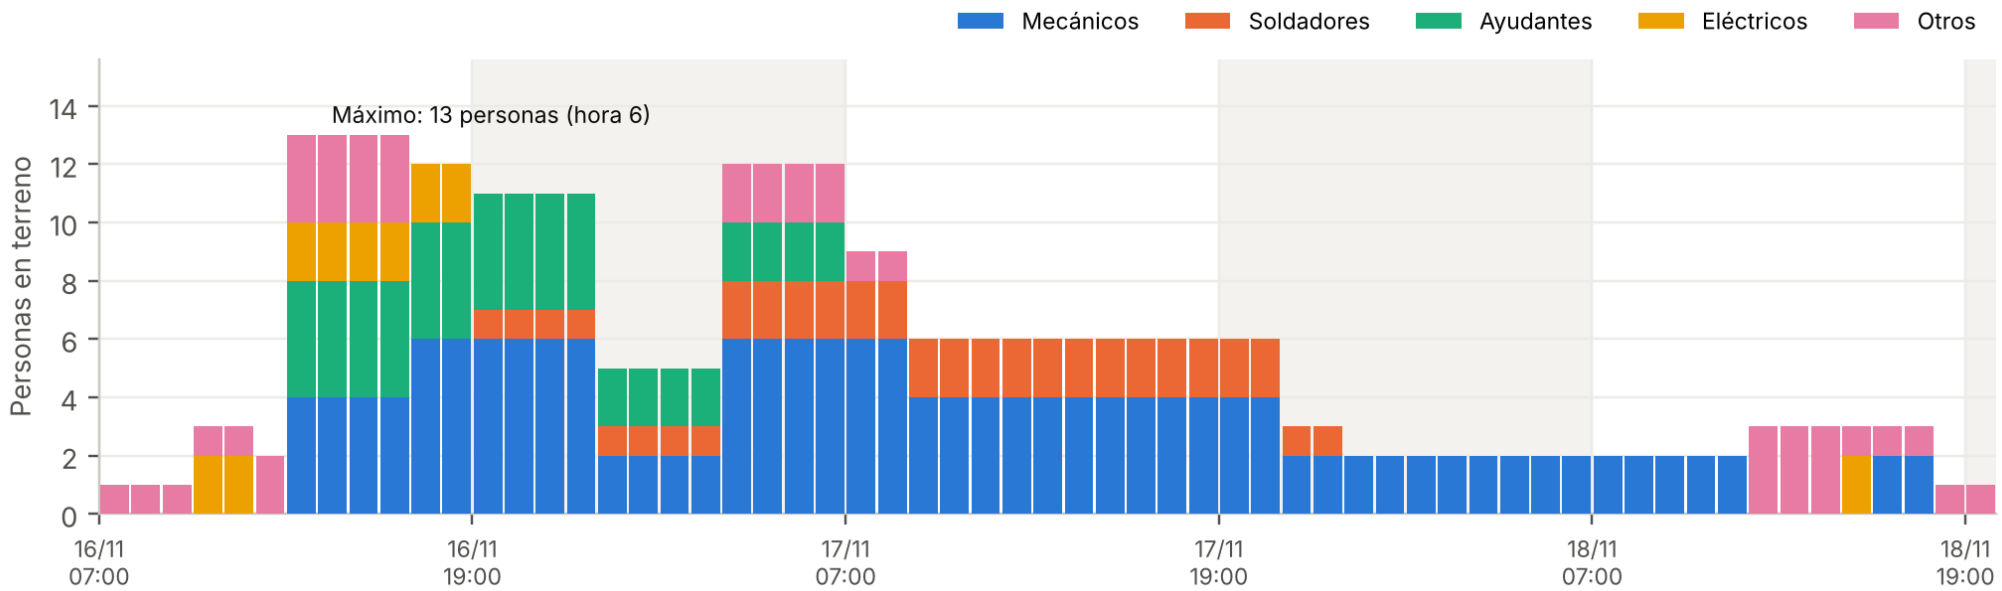

Costo por fase

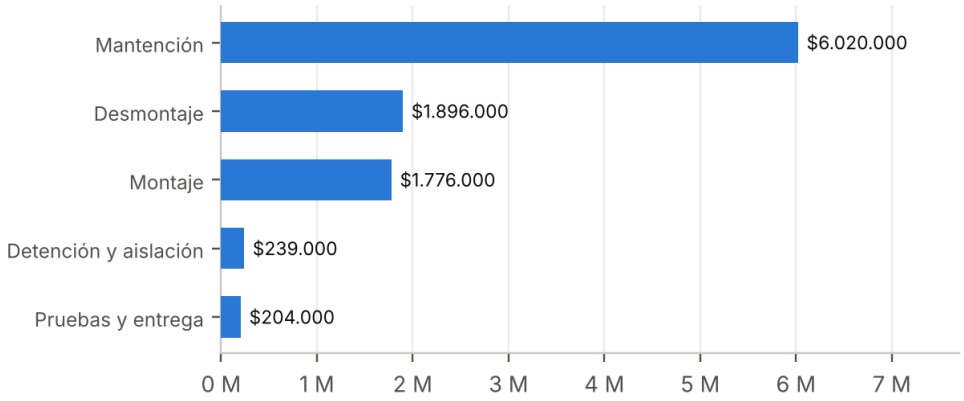

Costo por recurso

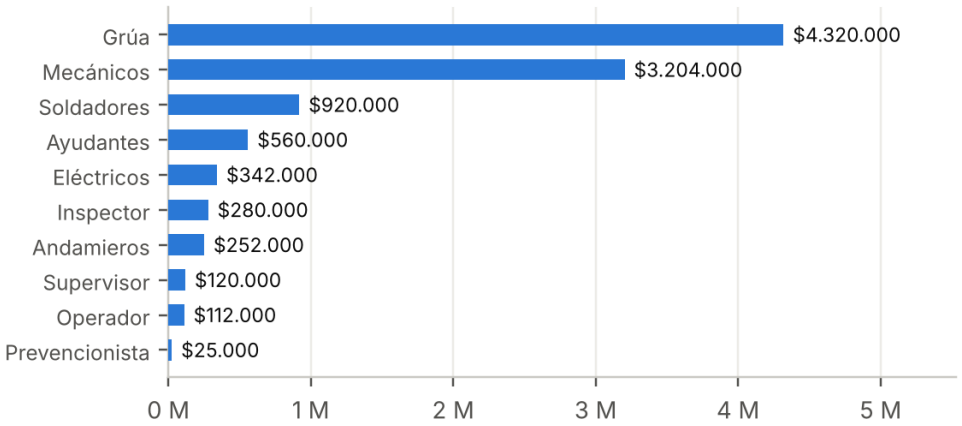

Detalle de actividades

Fechas de línea base, duración, holgura total y costo por actividad

Fila	Actividad	Inicio	Fin	Dur. (h)	Holgura (h)	Costo (CLP)	Crítica
1	**PARADA CHANCADOR PRIMARIO**	**16-11 07:00**	**18-11 20:00**	**61**		**$10.135.000**	
2	Inicio de parada	16-11 07:00	16-11 07:00	0	0		**Sí**
3	**Detención y aislación**	**16-11 07:00**	**16-11 13:00**	**6**		**$239.000**	
4	Vaciado de cámara de chancado	16-11 07:00	16-11 09:00	2	0	$32.000	**Sí**
5	Detención de chancador y correa de descarga	16-11 09:00	16-11 10:00	1	0	$16.000	**Sí**
6	Bloqueo y aislación de energías (LOTO)	16-11 10:00	16-11 12:00	2	0	$136.000	**Sí**
7	Prueba de energía cero y charla de seguridad	16-11 12:00	16-11 13:00	1	0	$55.000	**Sí**
8	**Desmontaje**	**16-11 13:00**	**17-11 03:00**	**14**		**$1.896.000**	
9	Instalación de andamios y accesos	16-11 13:00	16-11 17:00	4	0	$144.000	**Sí**
10	Retiro de araña (spider)	16-11 17:00	16-11 21:00	4	0	$624.000	**Sí**
11	Retiro de conjunto eje principal y manto	16-11 21:00	17-11 03:00	6	0	$936.000	**Sí**
12	Desconexión de sistema hidráulico	16-11 13:00	16-11 15:00	2	34	$72.000	
13	Limpieza de cámara de descarga	16-11 13:00	16-11 19:00	6	29	$120.000	
14	**Mantención**	**16-11 13:00**	**17-11 23:00**	**34**		**$6.020.000**	
15	Cambio de manto en taller	17-11 03:00	17-11 21:00	18	2	$1.008.000	
16	Inspección y medición de cóncavas	17-11 03:00	17-11 07:00	4	0	$256.000	**Sí**
17	Cambio de cóncavas hilera inferior	17-11 07:00	17-11 23:00	16	0	$2.816.000	**Sí**
18	Cambio de revestimientos cámara de descarga	16-11 19:00	17-11 07:00	12	29	$480.000	
19	Mantención hidráulica (filtros, aceite, sellos)	16-11 15:00	16-11 23:00	8	34	$288.000	
20	Mantención eléctrica motor principal	16-11 13:00	16-11 19:00	6	44	$228.000	
21	Cambio de polines y raspadores correa de descarga	16-11 13:00	16-11 23:00	10	40	$560.000	
22	Inspección de excéntrica y bujes	17-11 03:00	17-11 09:00	6	14	$384.000	
23	**Montaje**	**17-11 23:00**	**18-11 15:00**	**16**		**$1.776.000**	
24	Montaje eje principal con manto nuevo	17-11 23:00	18-11 05:00	6	0	$936.000	**Sí**
25	Montaje y ajuste de araña	18-11 05:00	18-11 09:00	4	0	$624.000	**Sí**
26	Reconexión hidráulica y ajuste de setting	18-11 09:00	18-11 12:00	3	0	$108.000	**Sí**
27	Retiro de andamios	18-11 12:00	18-11 15:00	3	0	$108.000	**Sí**
28	**Pruebas y entrega**	**18-11 15:00**	**18-11 20:00**	**5**		**$204.000**	
29	Retiro de bloqueos y energización	18-11 15:00	18-11 16:00	1	0	$68.000	**Sí**
30	Prueba en vacío	18-11 16:00	18-11 18:00	2	0	$104.000	**Sí**
31	Prueba con carga	18-11 18:00	18-11 20:00	2	0	$32.000	**Sí**
32	Entrega a operaciones	18-11 20:00	18-11 20:00	0	0		**Sí**
